


PŮDORYS 3NP

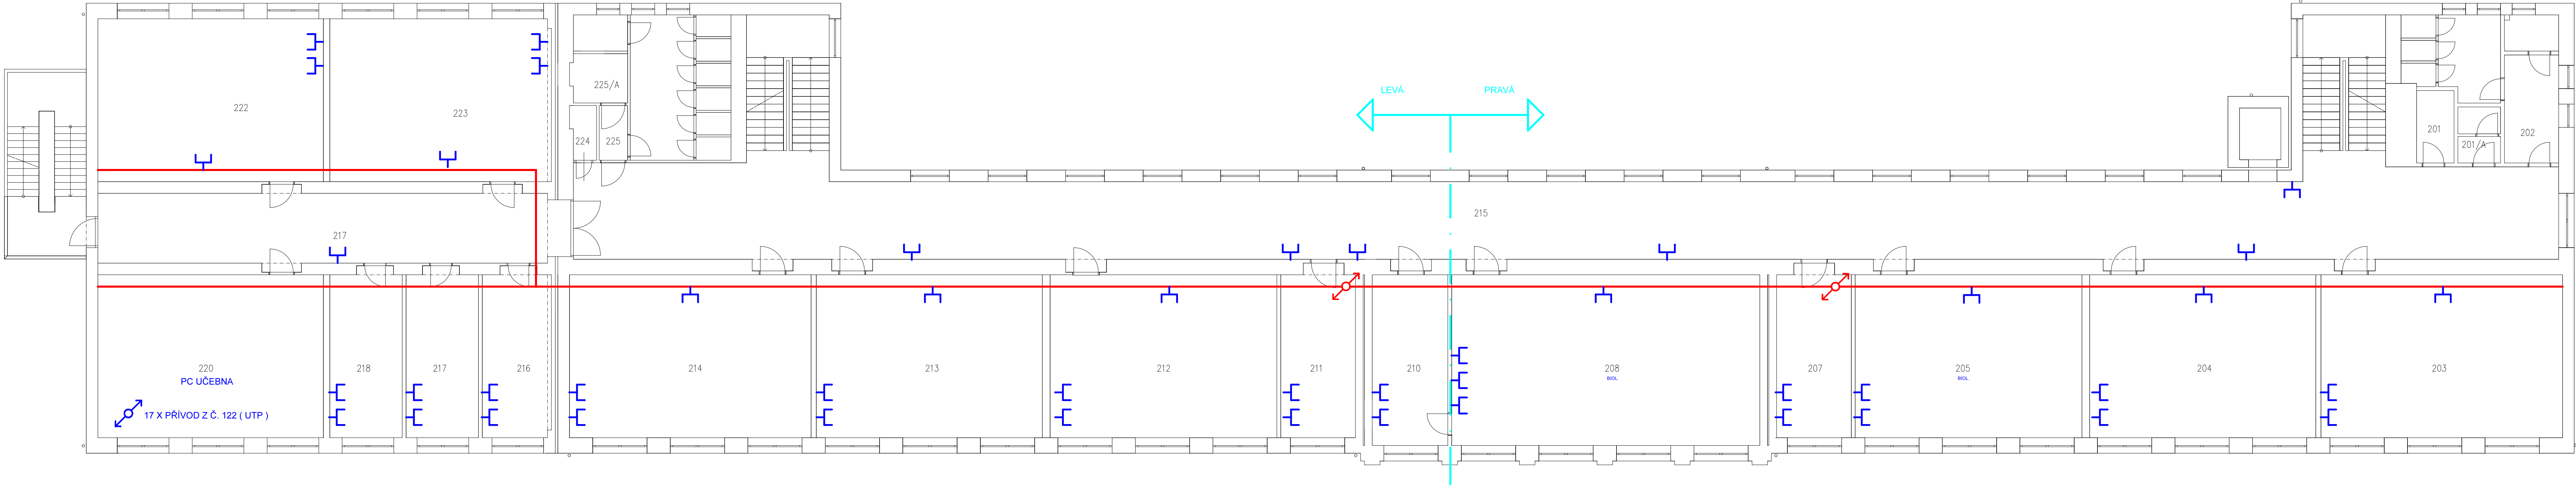

Rozdělení rekonstrukce LAN a Wi-Fi sítě na Gymnáziu Třinec

Rozdělení je nutné z hlediska samofinancování (projekt OPST je vyčerpán) a to na 3 fáze.

1.Fáze:(max. 1 mil. Kč s DPH) - realizace VP 2023 (20.7.-15.9.2023)

Kompletní stavební úpravy poloviny školy. Rozdělení je vyznačeno na plánech z MSDC a to:

- 1.- Suterén (šatny) se zajišťuje směrem od hlavního vchodu ke keramické dílně dle projektové dokumentace.
- 2.- 1. nadzemní podlaží od místnosti č. 78 po místnost č. 73
- 3.- 2. nadzemní podlaží od místnosti č. 113 po místnost č. 103
- 4.- 3. nadzemní podlaží od místnosti č. 206 po místnost č. 203
- 5.- 4. nadzemní podlaží od místnosti č. 310 po místnost č. 204
- 6.- Místnost č. 105 a č. 310 jsou brány jak o PC učebny a je nutno ve stávajících rozvodech vyměnit kab. a zásuvky.
- 7.- 1. a 2. nadzemní podlaží jídelna, kuchyně a patro s kabinety.
- 8.- Propojení v nových rack skříních dle technické specifikace z MSDC (patch panely, switche apod.)

Vybudování dvou nových rackových skříní, místnost č. 109 (2.NP) a místnost č. 48 (2.NP blok jídelna)

Připojení do hlavní serverovny školy optikou, dle návrhu MSDC (doporučuji konzultaci s MSDC)

2.Fáze:(realizace VP 2024)

Kompletní stavební úpravy ve druhé polovině školy, rozdělení je vyznačeno na plánech z MSDC.

- 1.- V podlažích od fáze jedna na druhou stranu. Rozvody jsou vedeny z hlavní serverovny.
- 2.- Místnost č. 122 a 220 jsou učebny ICT s počítači, je tedy nutno vyměnit stávající LAN rozvody a zásuvky.
- 3.- Výměna aktivních prvků (patch panely, switche apod.) ve stávajících rack skříních (budou-li technicky vyhovovat), dle specifikace MSDC a dle typů ve fázi č. 1

3.Fáze:(realizace VP 2024 - VP 2025)

Výměna aktivních prvků LAN a Wi-Fi sítě, zprovoznění nové Wi-Fi, konfigurace nového serveru, switche. Nastavení provozuschopnosti LAN a Wi-Fi sítě, nastavení VLAN. Kompletní konfigurace aktivních prvků. Doporučená komunikace s MSDC a DLNK a.s.

Přenos stávajících serverů (virtuálních i fyzických) na nové. Kompletní konfigurace a otestování 100%funkčnosti. Doplnění všech změn do projektové dokumentace.

LG

Architektura & desing

PŘÍLOHA: 1 2 3 4 5 6	STAVEBNÍK: GYMNÁZIUM TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO 713, STARE MĚSTO 759 61 TŘINEC IČO: 00 60 13 90	VEDOUcí PROJEKTANT: MAREK ERNST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIRÍ KAHÁNEK VYPRACOVAL: ING. JIRÍ KAHÁNEK	LEGOLA CZECH s.r.o. SIDLEM: KLÍNOVA 620/1, 700 00 OSTRAVA - HULVÁKY IČO: 253 05 875, DIČ: CZ 253 05 879 ID SCHRÁNKY: whd@legola.cz OČAÚT: 0500055 mobil: +420 752 435 186 email: jiri.kahane@legola.cz	
	STAVBA: " MODERNIZACE UČEBEN GYMNÁZIA TŘINEC " " REKONSTRUKCE LAN A WI - FI SÍTĚ " NA PARCELNÍM ČÍSLE: 2465/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘINEC [7 08 02]		ČÍSLO ZAKÁZKY: 202301	
	OBŠAH: PUDORYS 3.N.P. - NOVÝ STAV		STUPEŇ: ZADÁNÍ STAVBY	
	Díl: D.2 DOKUMENTACE TECHNIC. A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ		MÉRITKO: M 1: 50	DATUM: 3/2023
			VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.1.b.04	
